


ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉSI PROBLÉMÁK


- Aktuális előrehaladási adatok nincsenek összegyűjtve
- Múltba tekintés
- Az értekezletek jegyzőkönyvei hiányoznak
- Nagy 'ellenőrzési' összejövetelek vannak csak


AZ ELLENŐRZÉS IGÉNYEI

- Az aktualitások feljegyzése
- Előrejelzés
- Rövid megbeszélések az elvégzendő feladatok írásbeli rögzítésével
- A minőségellenőrzéssel és a változás kezeléssel való összekapcsolás





AZ IRÁNYÍTÁSI FOLYAMAT

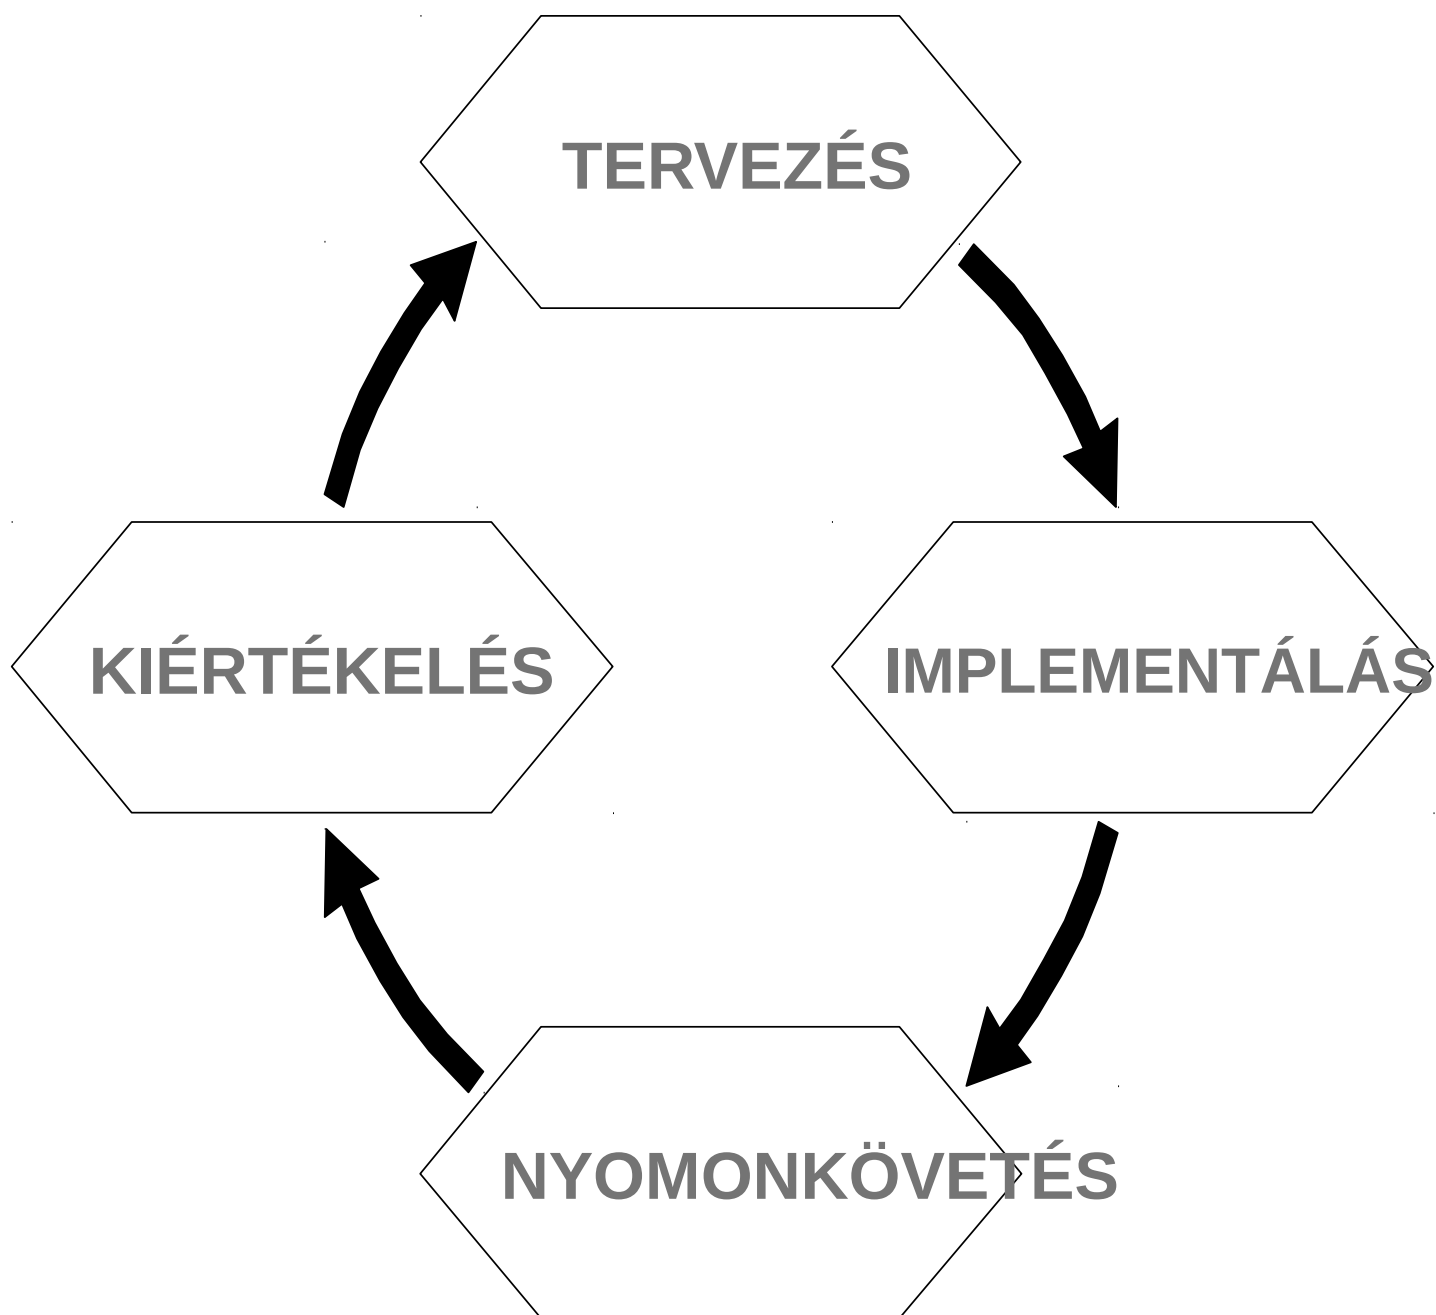




A TERVEZÉS KOMPONENSEI

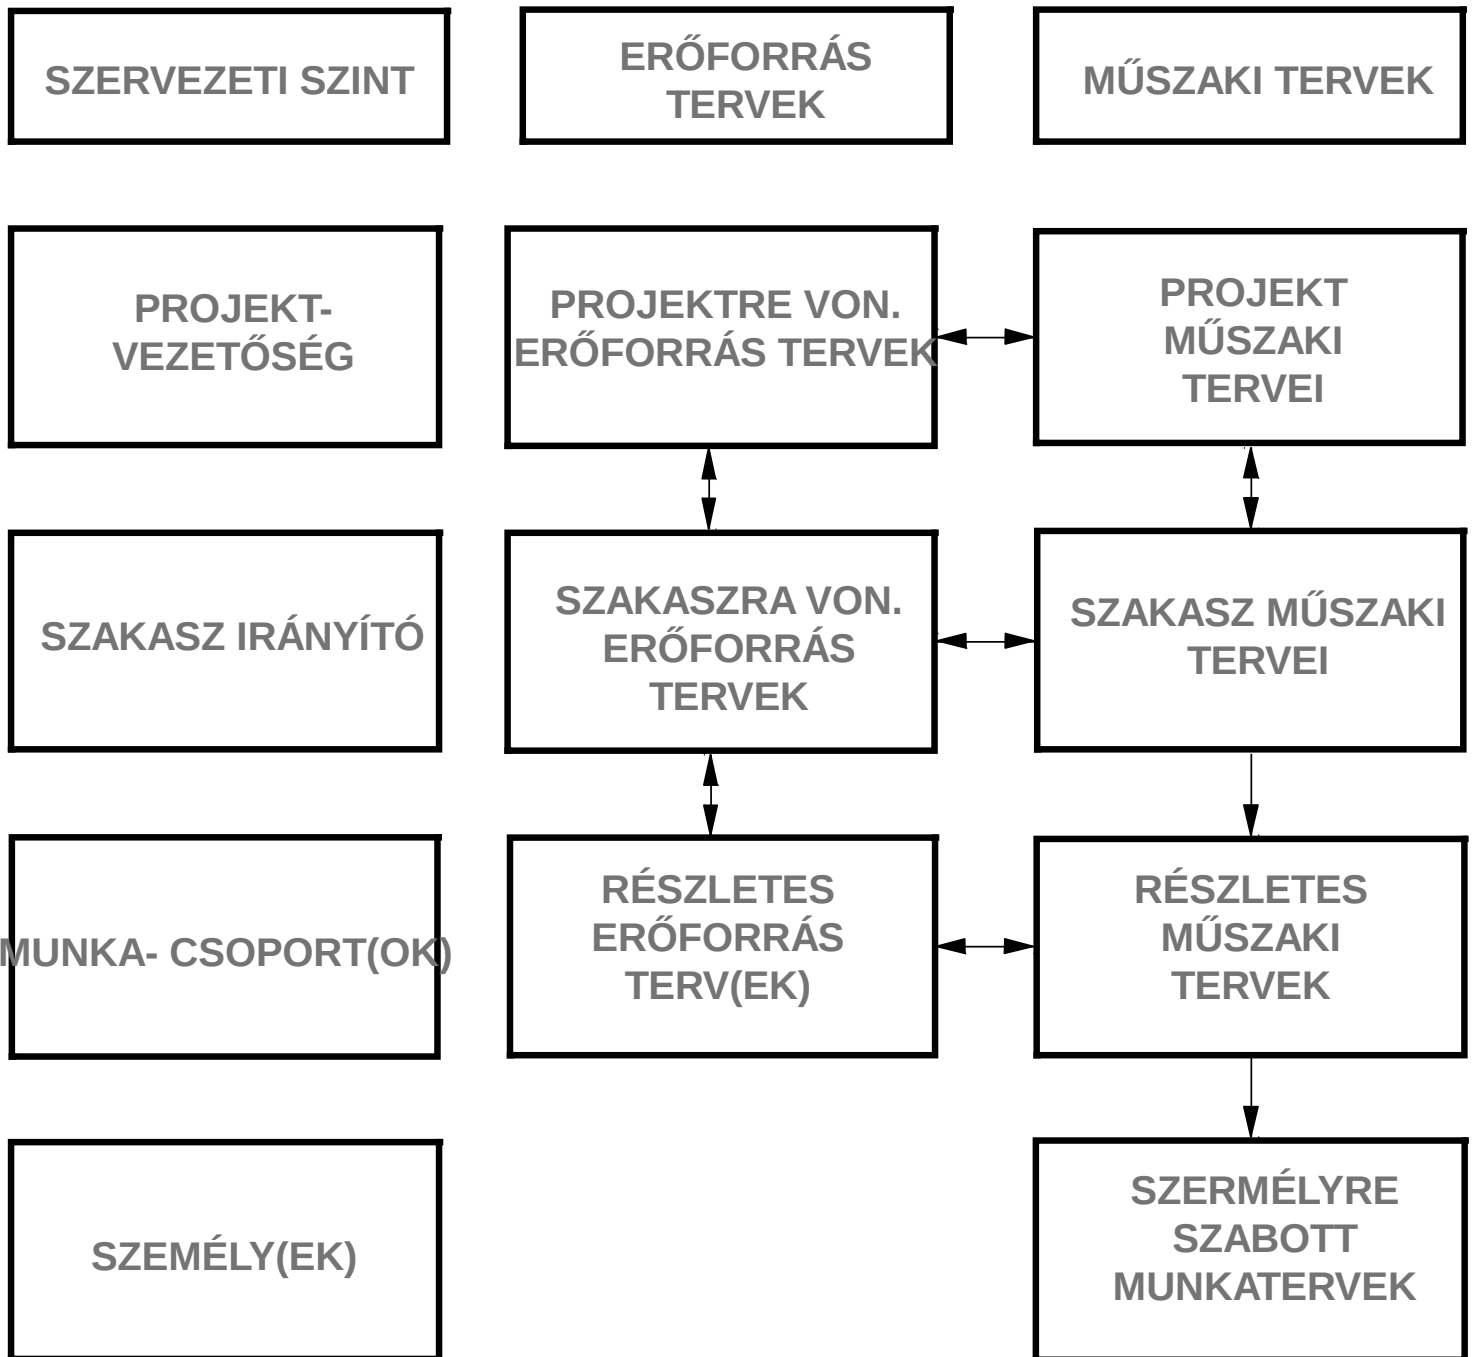




AZ ELŐREHALADÁS MÉRÉSE

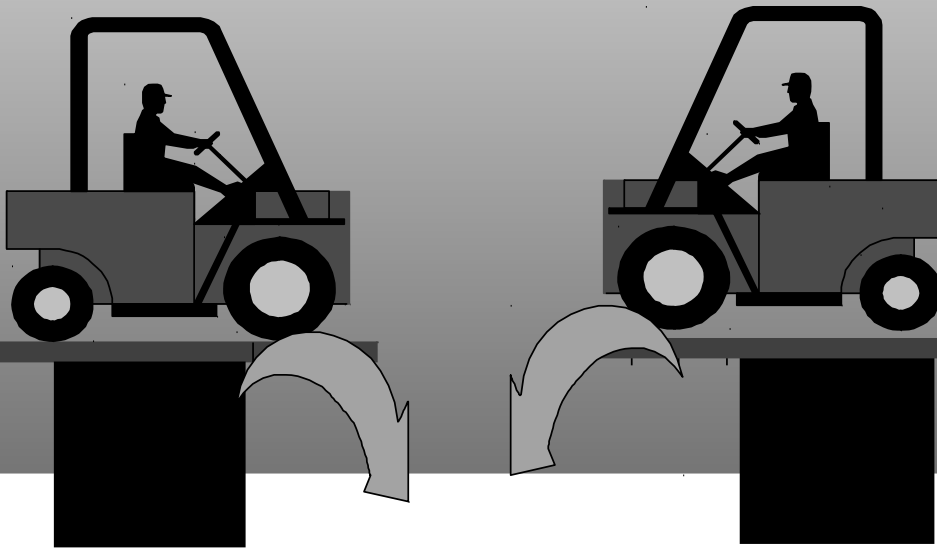

*"EMBEREK, VAN EGY JÓ HÍREM :
A PROJEKT 90%-BAN KÉSZ."*

"A FAL"

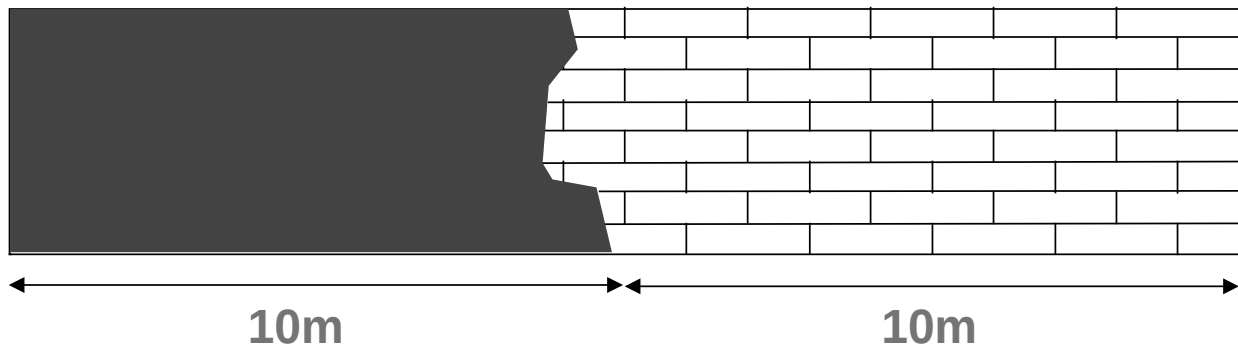

20 órára becsülték (1m/ó)

15 óra eltelt

További 15 kell? 50% készülség?

Talán, de miért nem:

? használunk nagyobb ecsetet

? fújjuk be

? kérünk segítséget (több ecsetre van szükség)

És az alábbiak:

? elfáradás


? abszorbeálás (több festék kell)

? rossz volt a becslés, tanulság későbbre


***A SZÁMOK ÖNMAGUKBAN NEM
VÉGLEGESEK - EMLÉKEZZÜNK A TELJES
IRÁNYÍTÁSI CIKLUSRA!!!***

PROJECT PARAMÉTEREK


Költség/erőforrások



Időhatárok




Terjedelem/határok






Termékminőség

HELYREIGAZÍTÁSI TERVEK

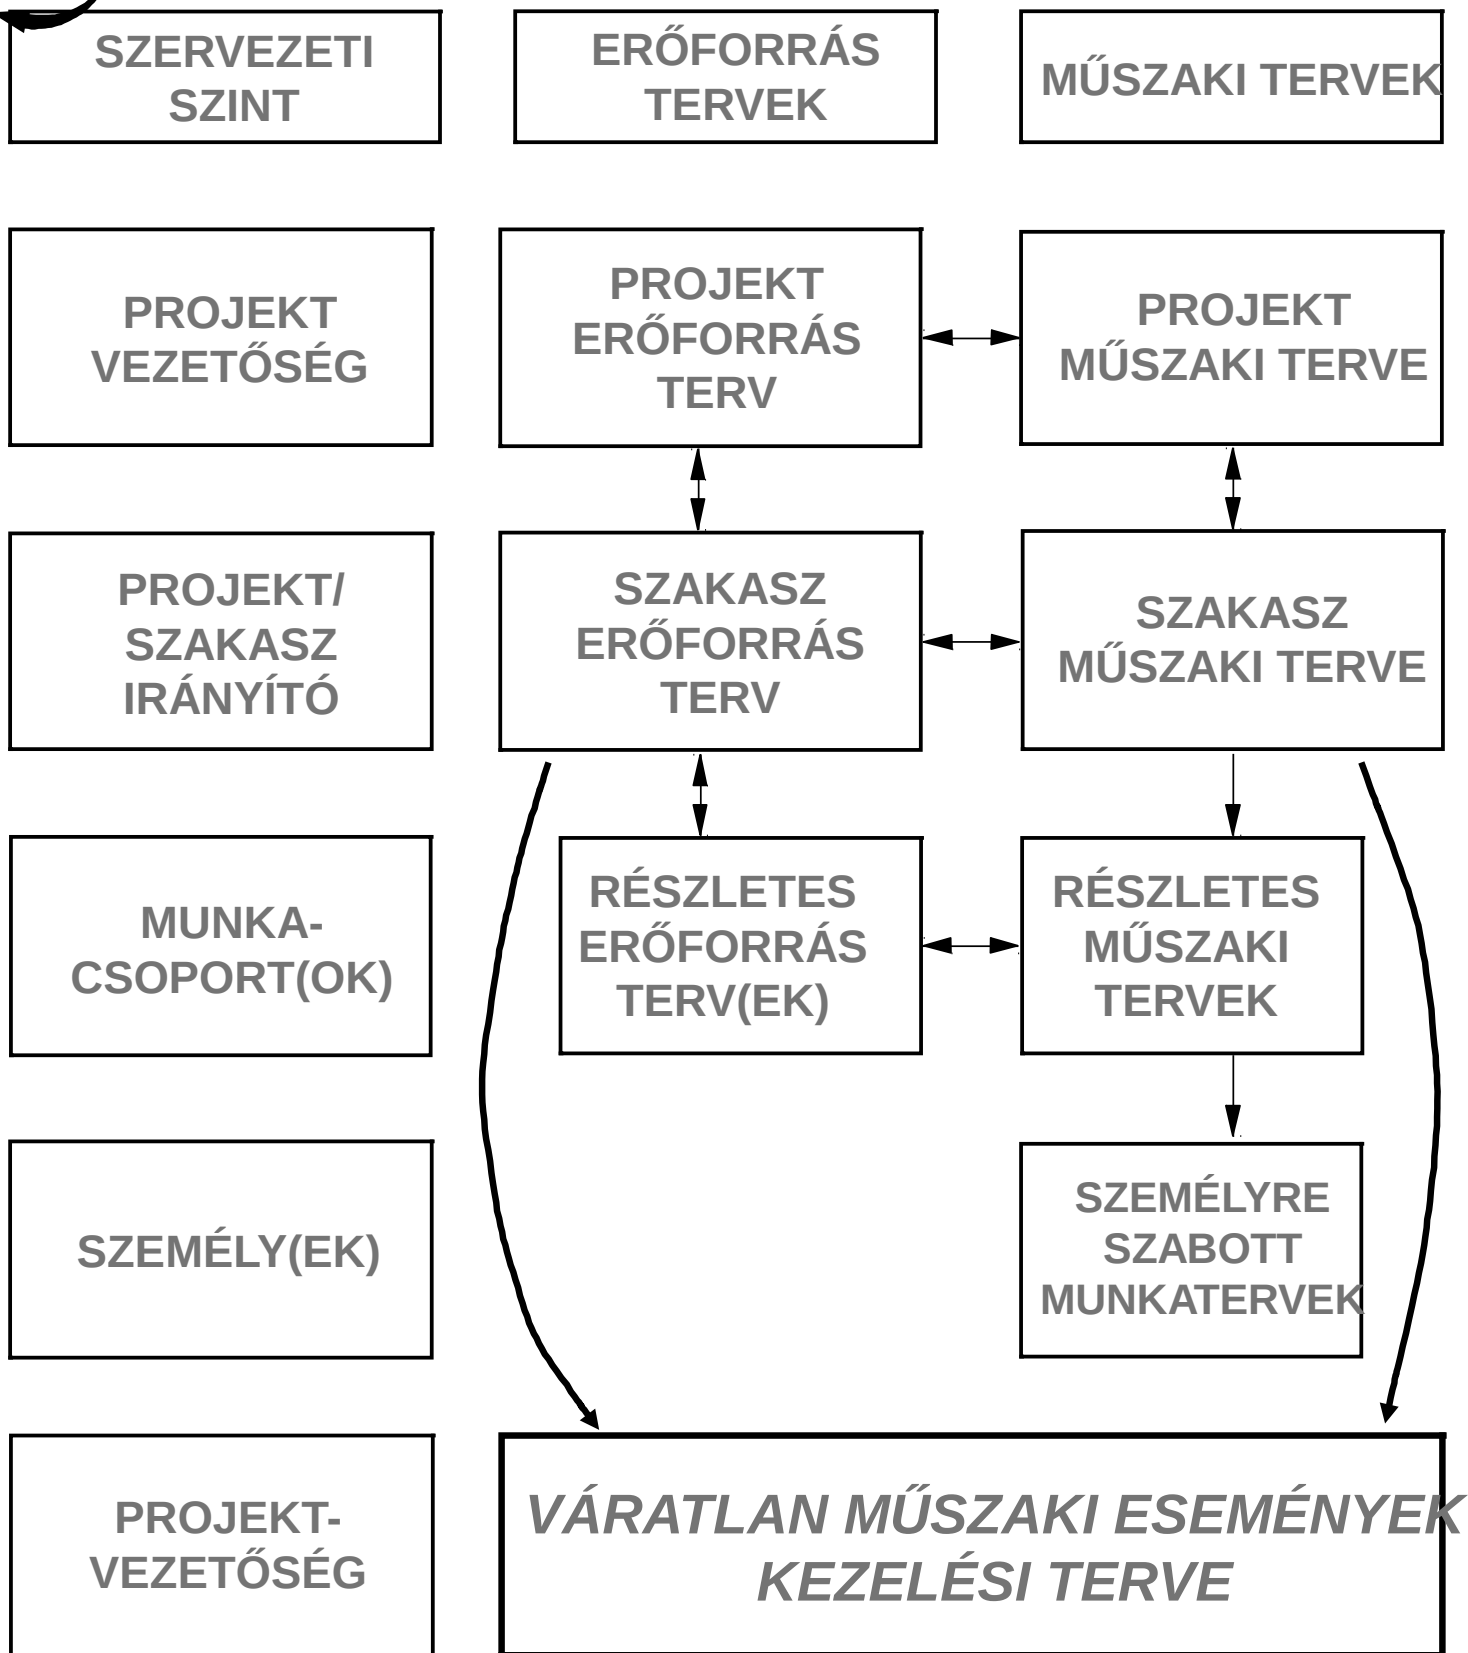



FELADATKIOSZTÁS ÉS ELŐREHALADÁS ELLENŐRZ.

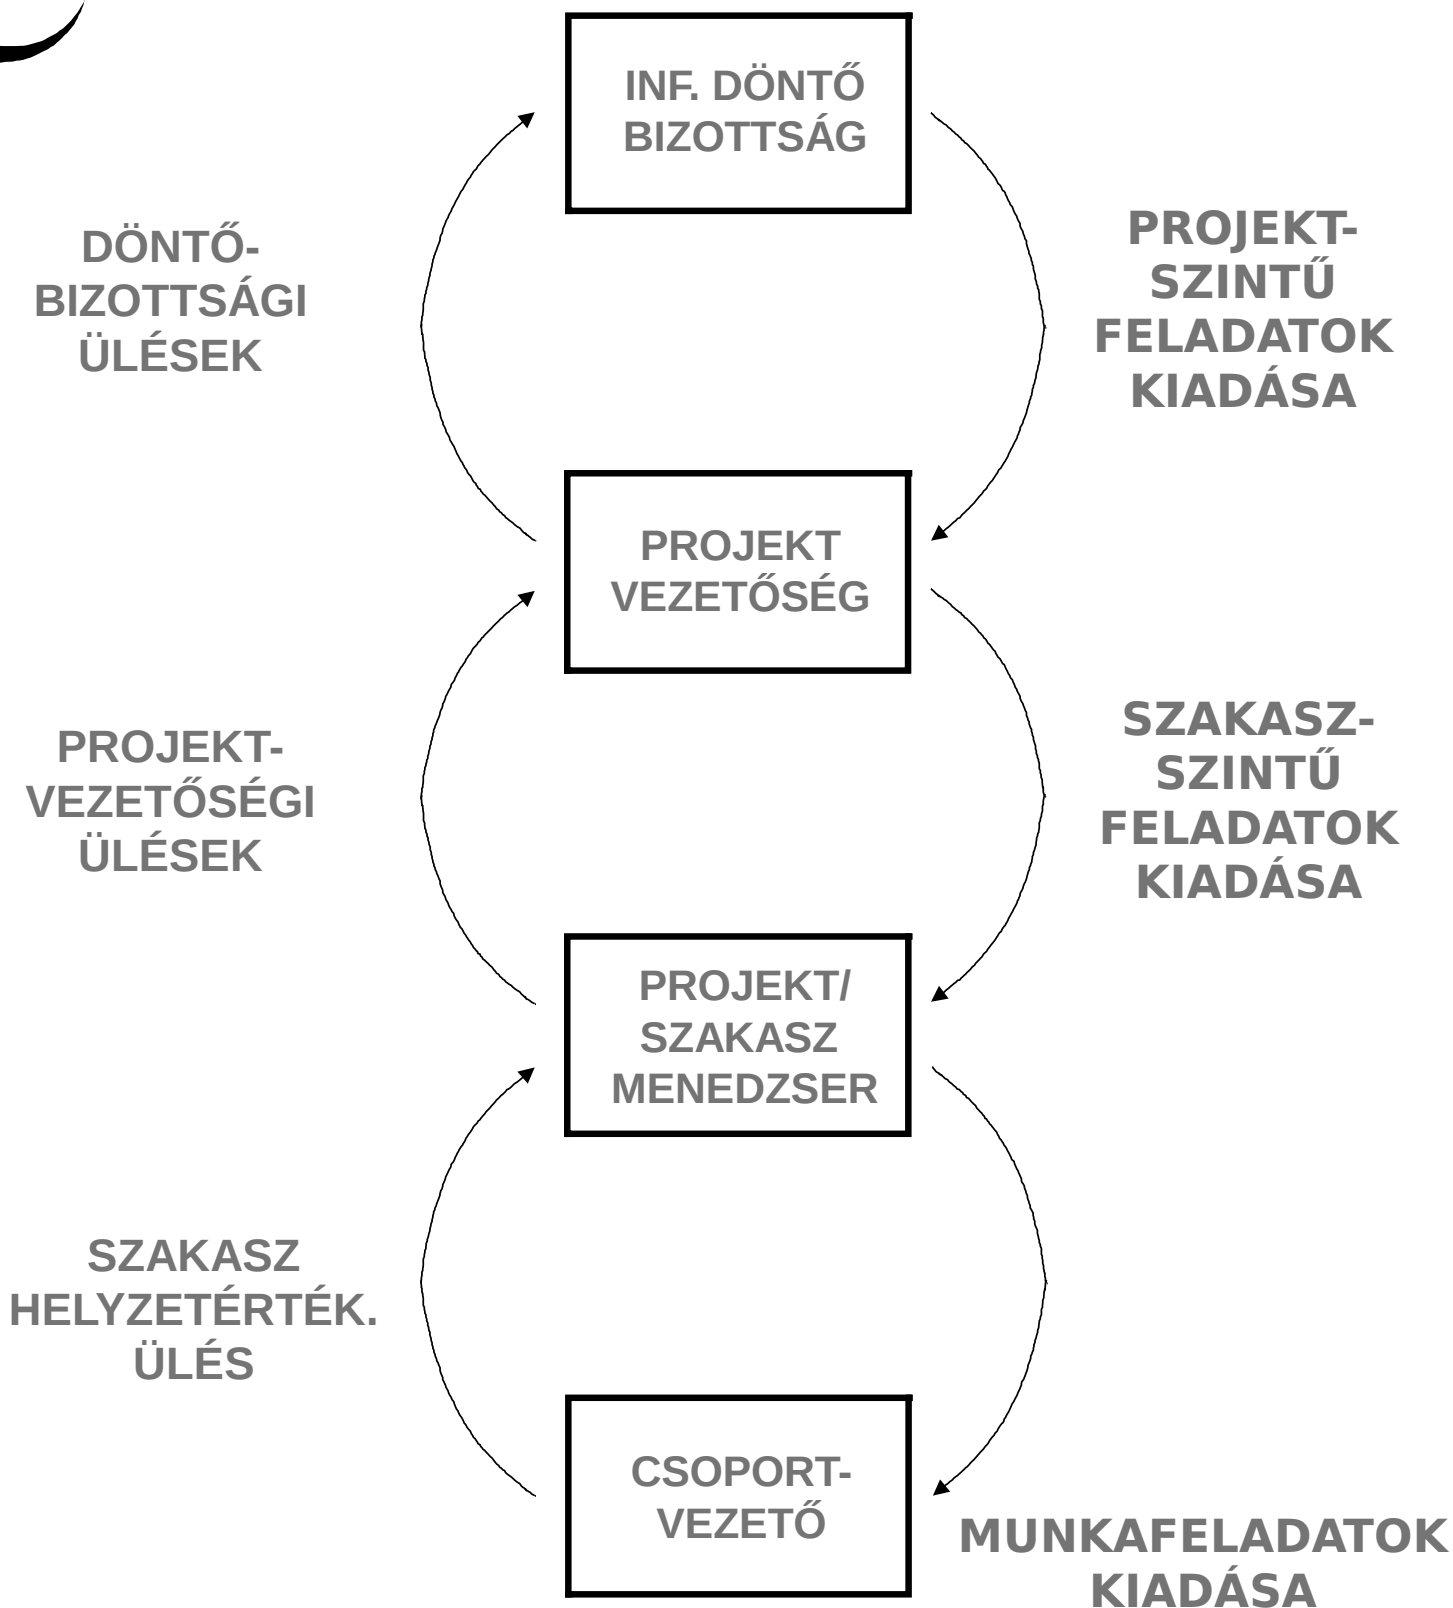




AZ ÉRTEKEZLETEK SZERKEZETE

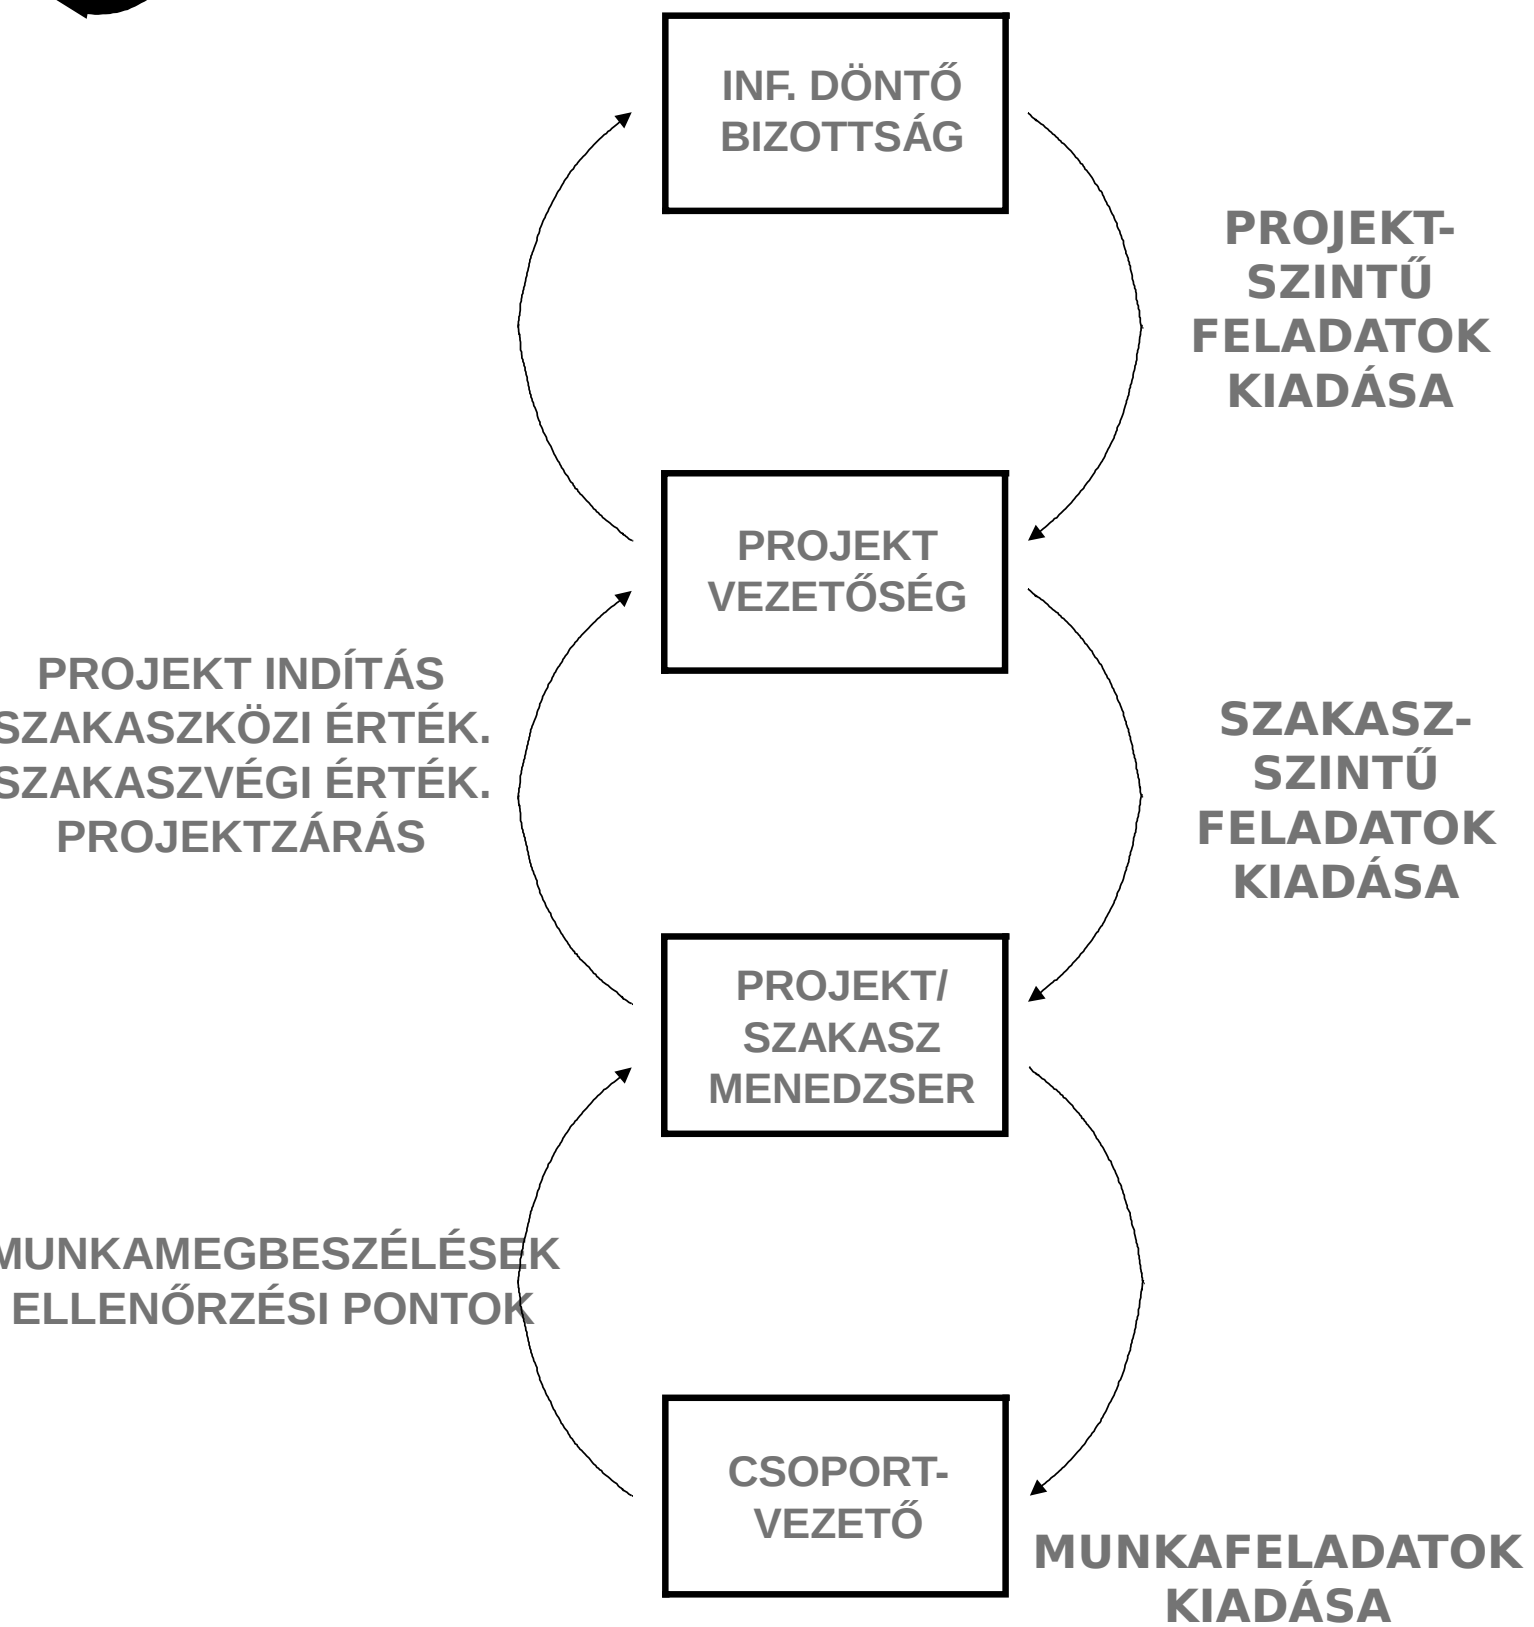



JELENTÉSTÉTEL

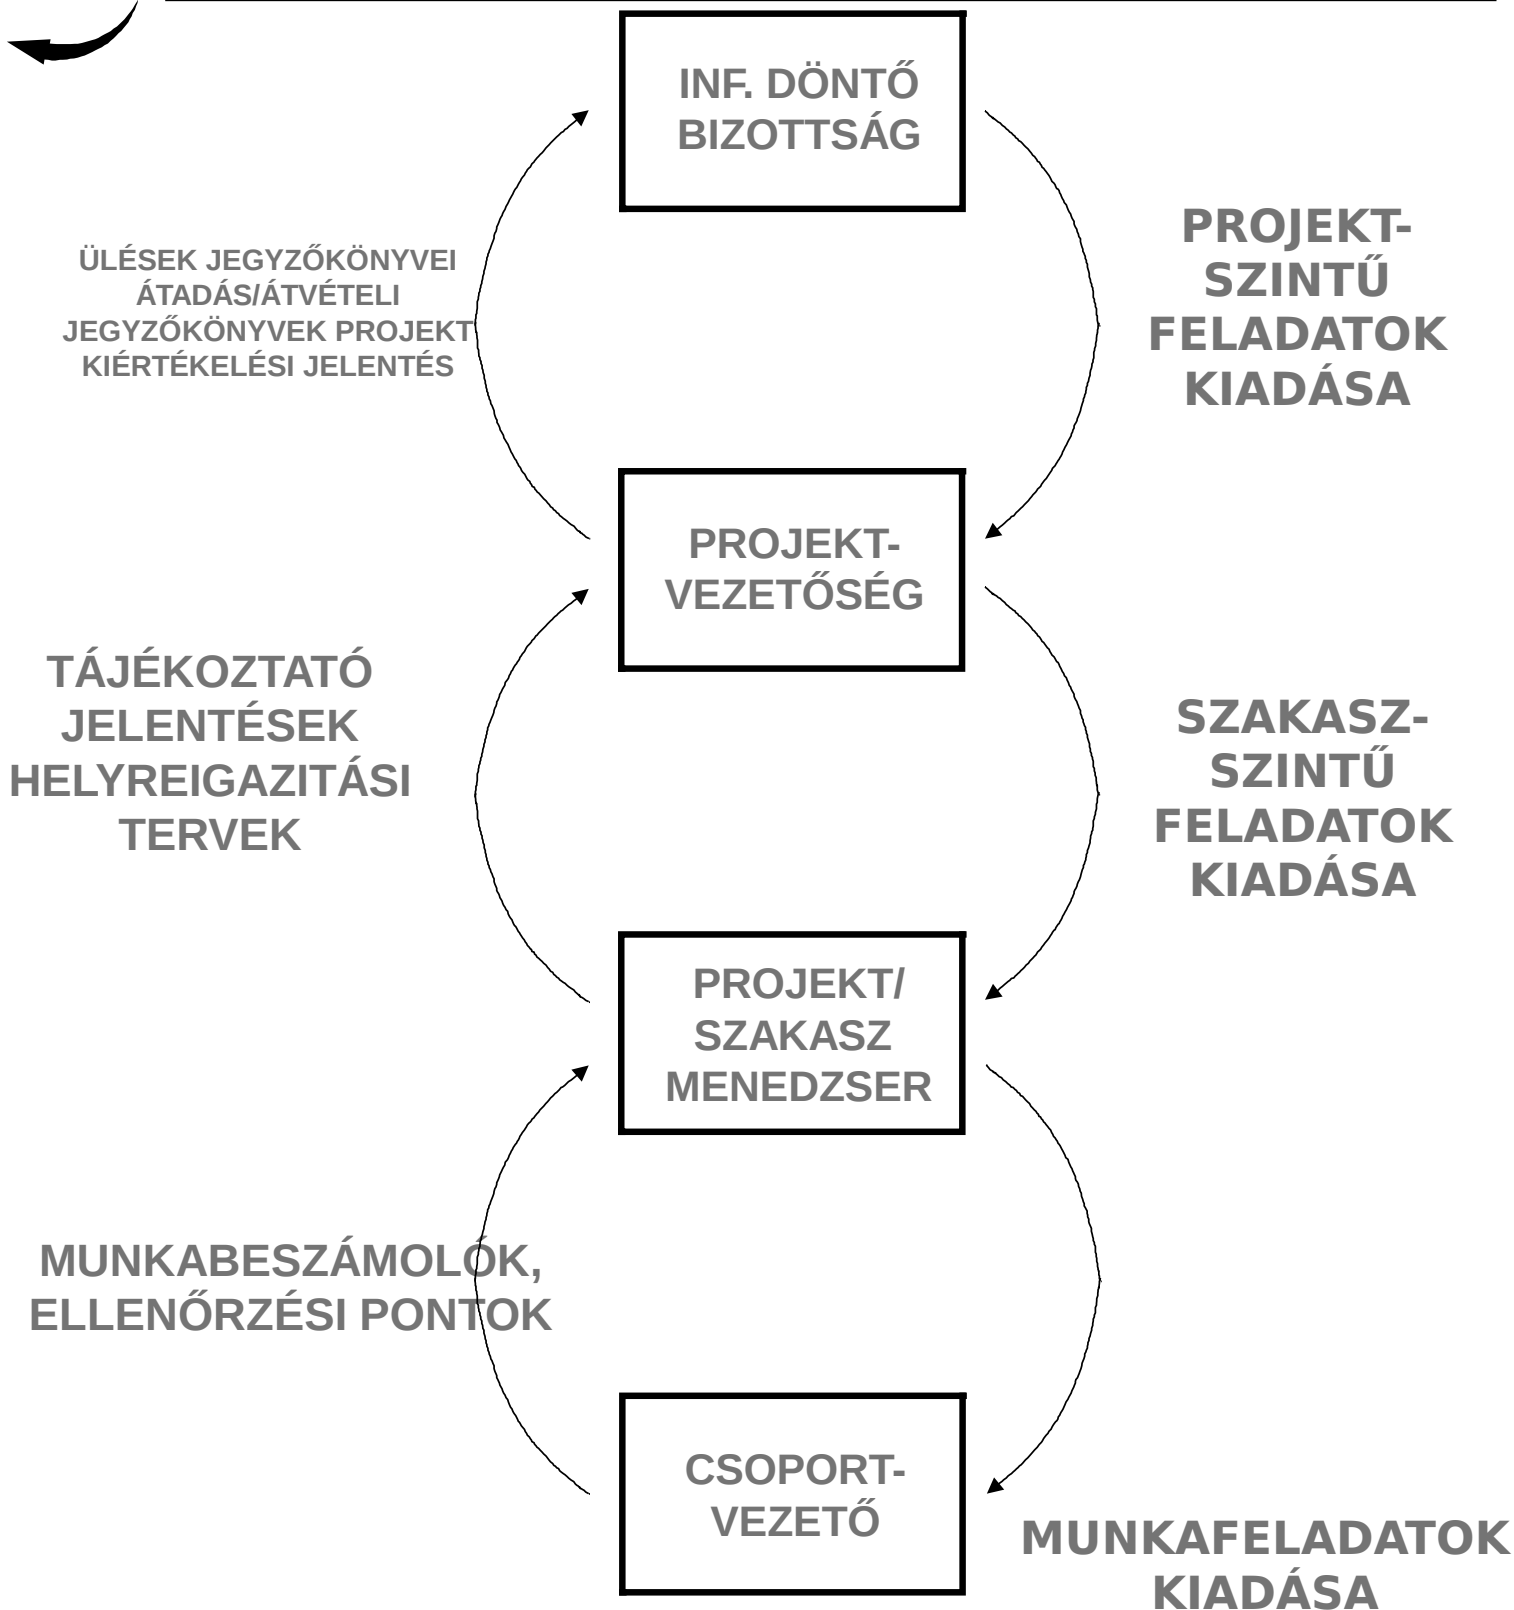




PROJEKTÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI


- TELJESÍTMÉNY
- TERMELÉKENYSÉG
- MINŐSÉG
- FEJLESZTÉSI MÓDSZER
- PROJEKT VEZETÉS




NYOMONKÖVETÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL

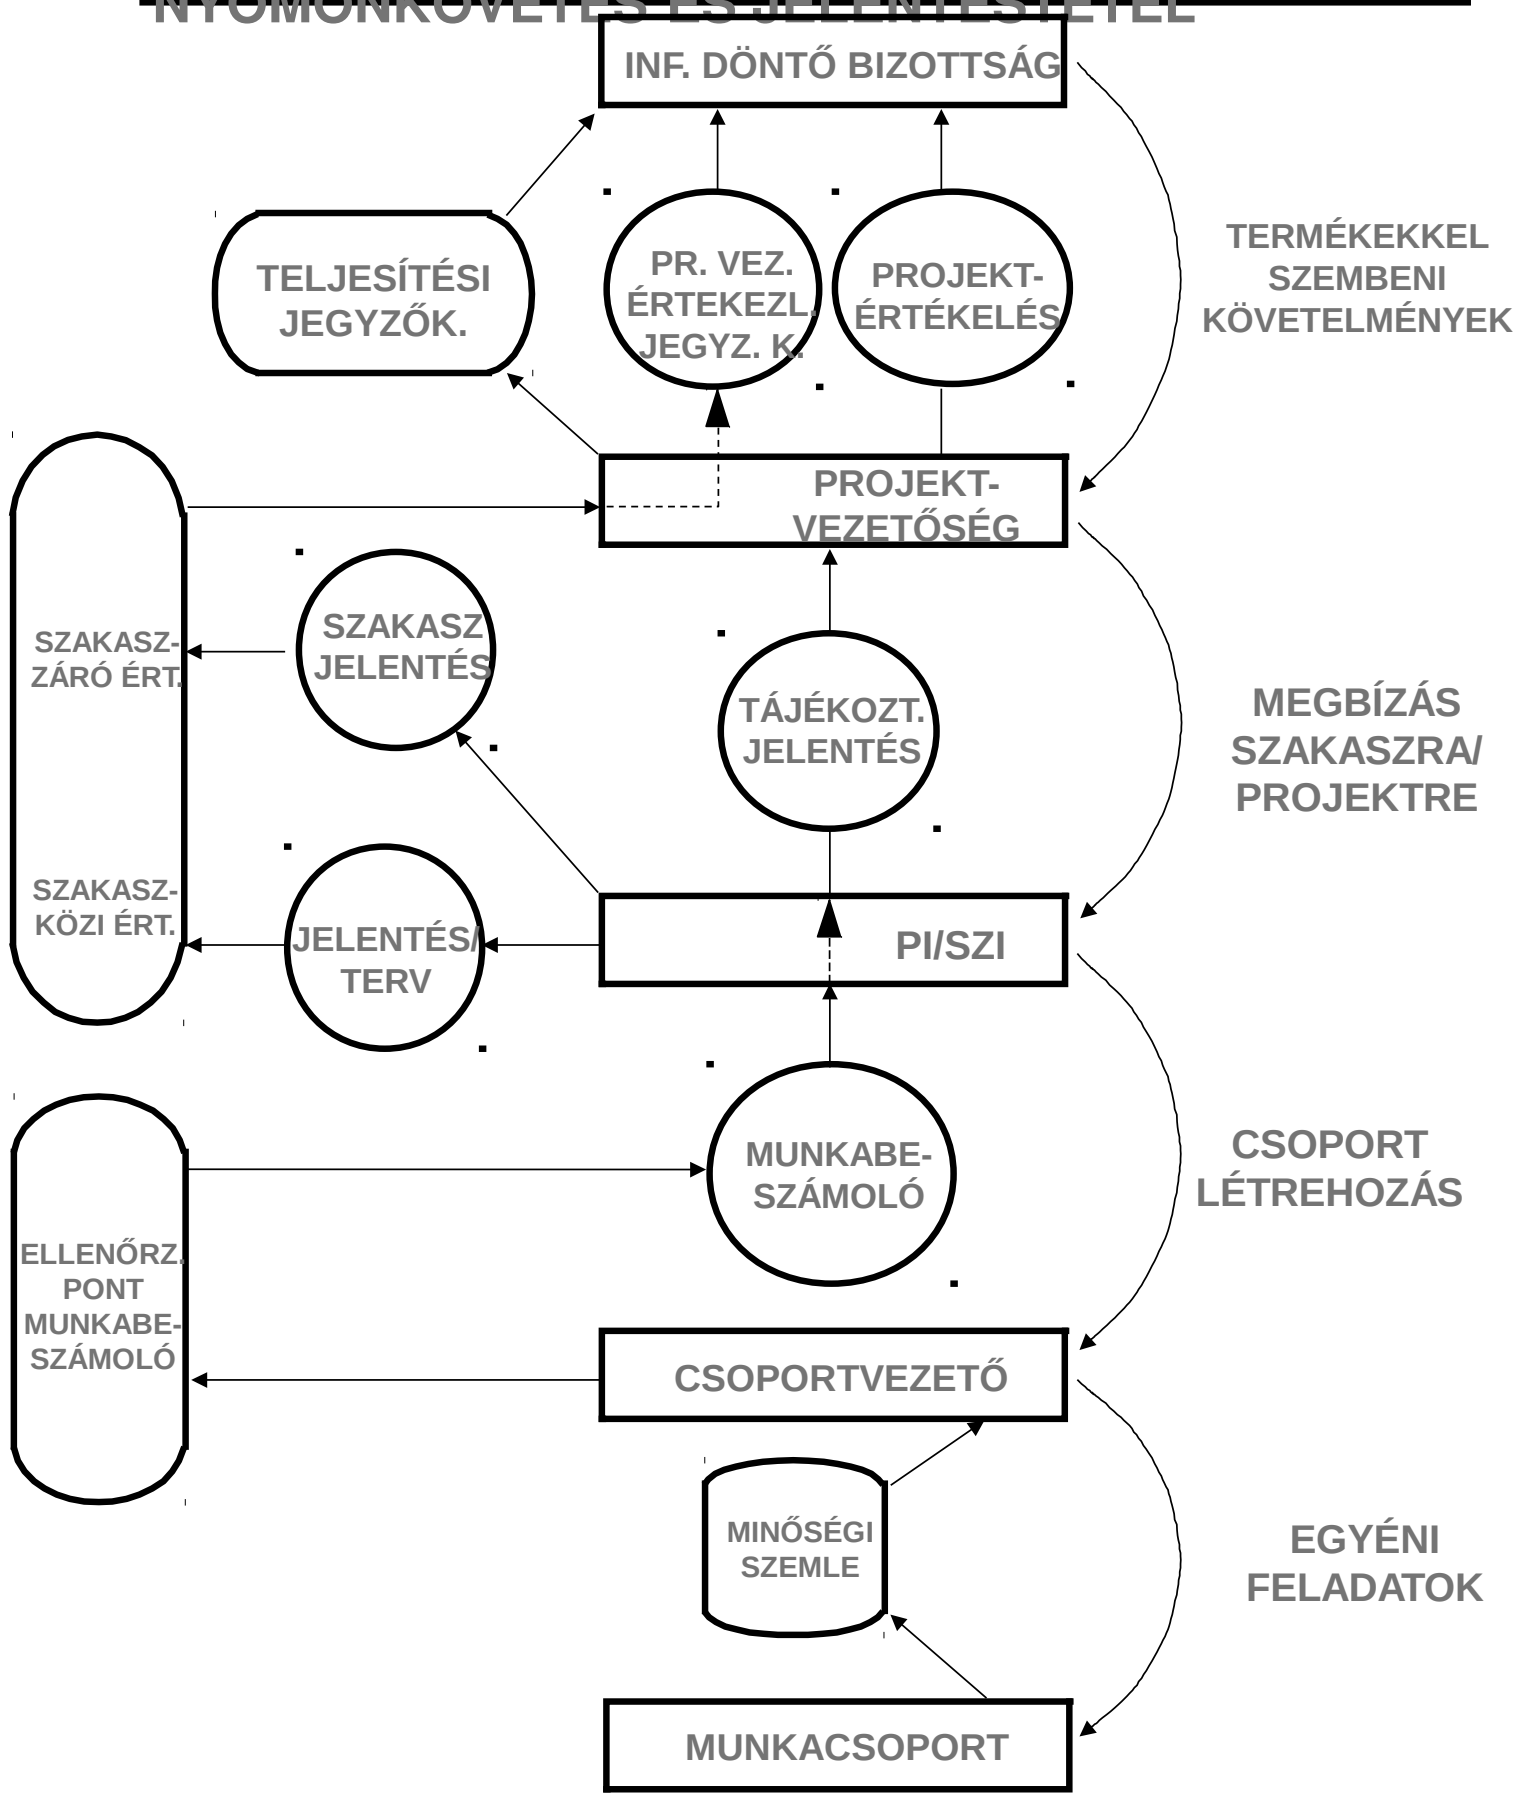


KÖLTSÉGGÖRBE

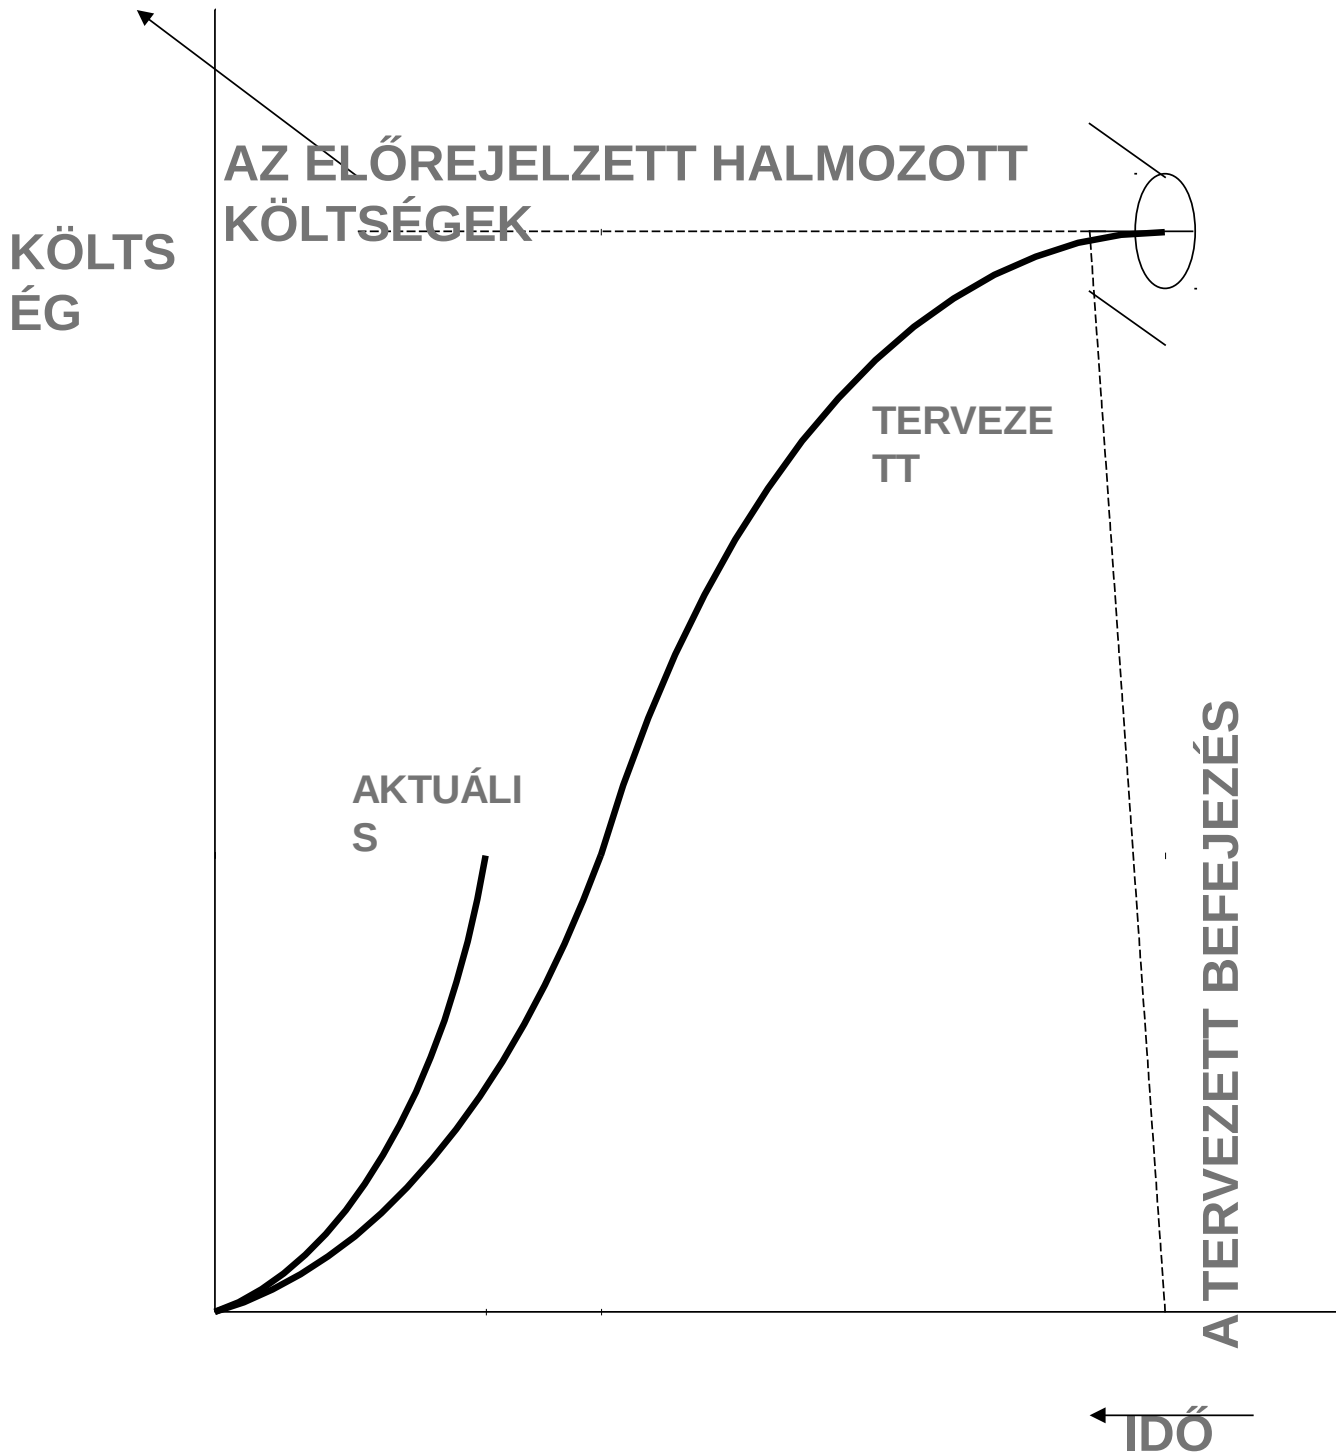

ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS




HOZZÁADOTT ÉRTÉK

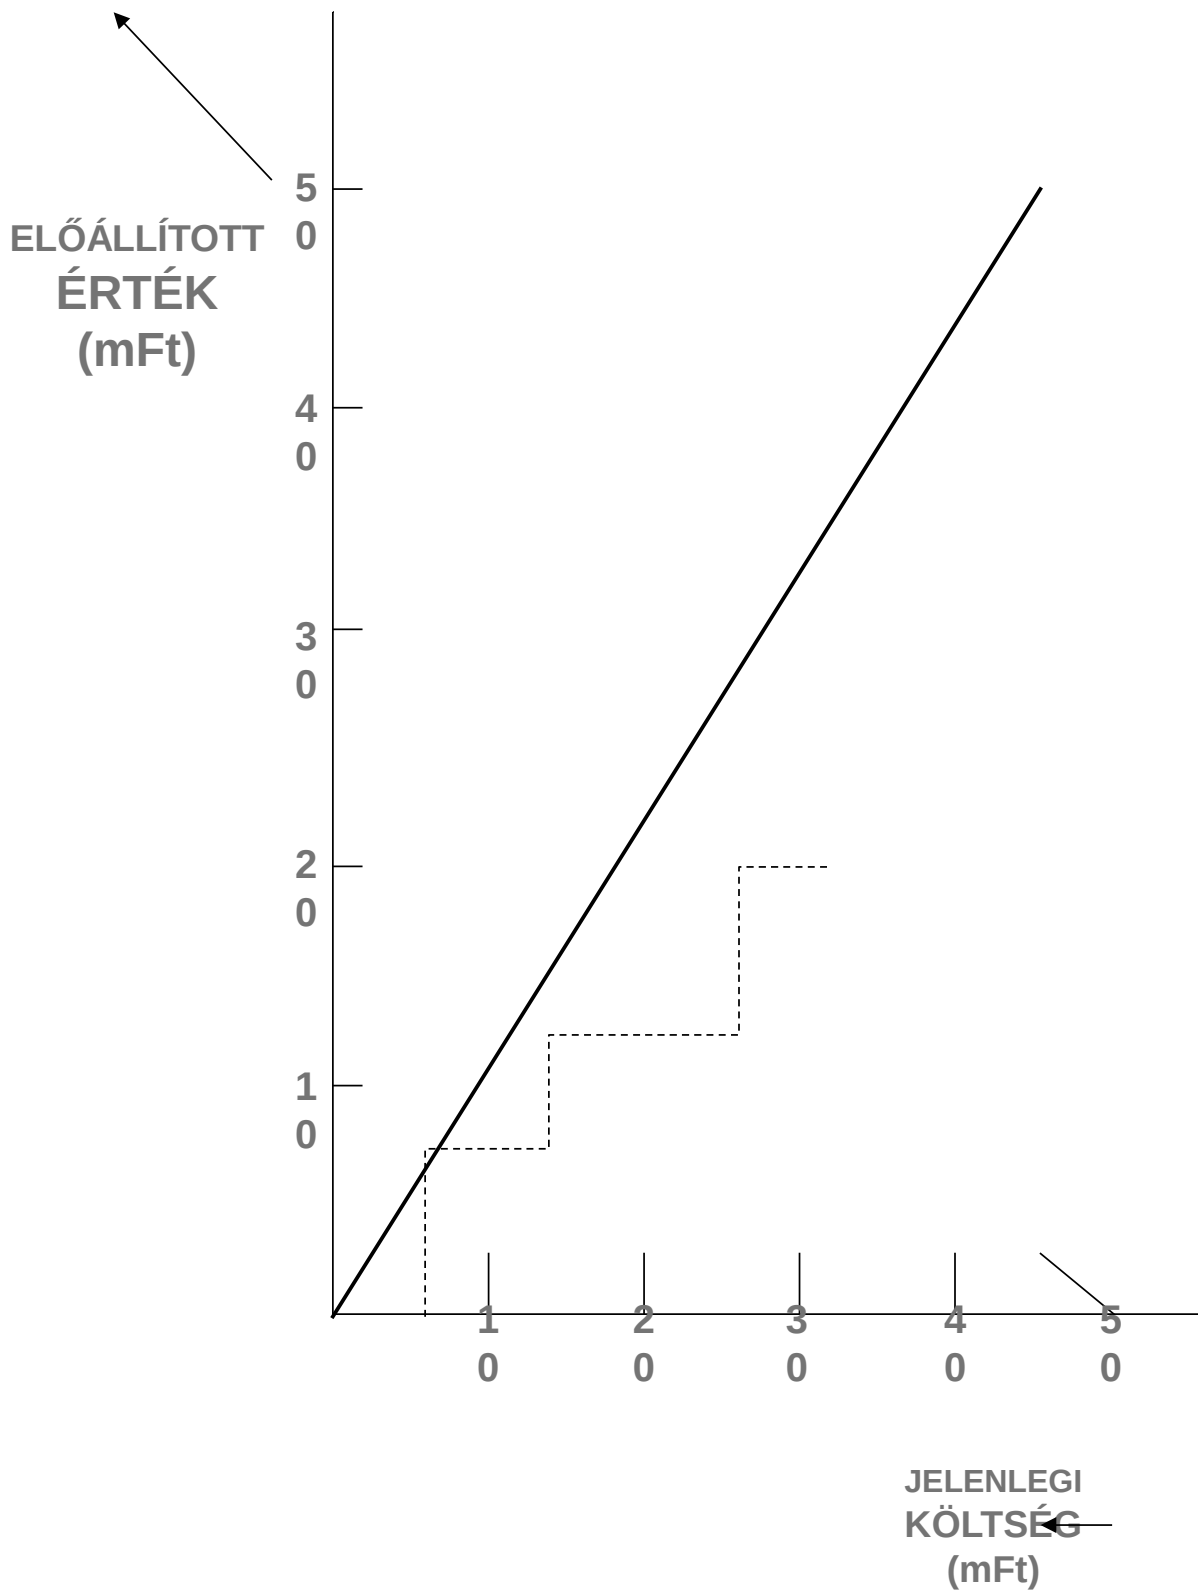

ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS



TŰRÉSHATÁR

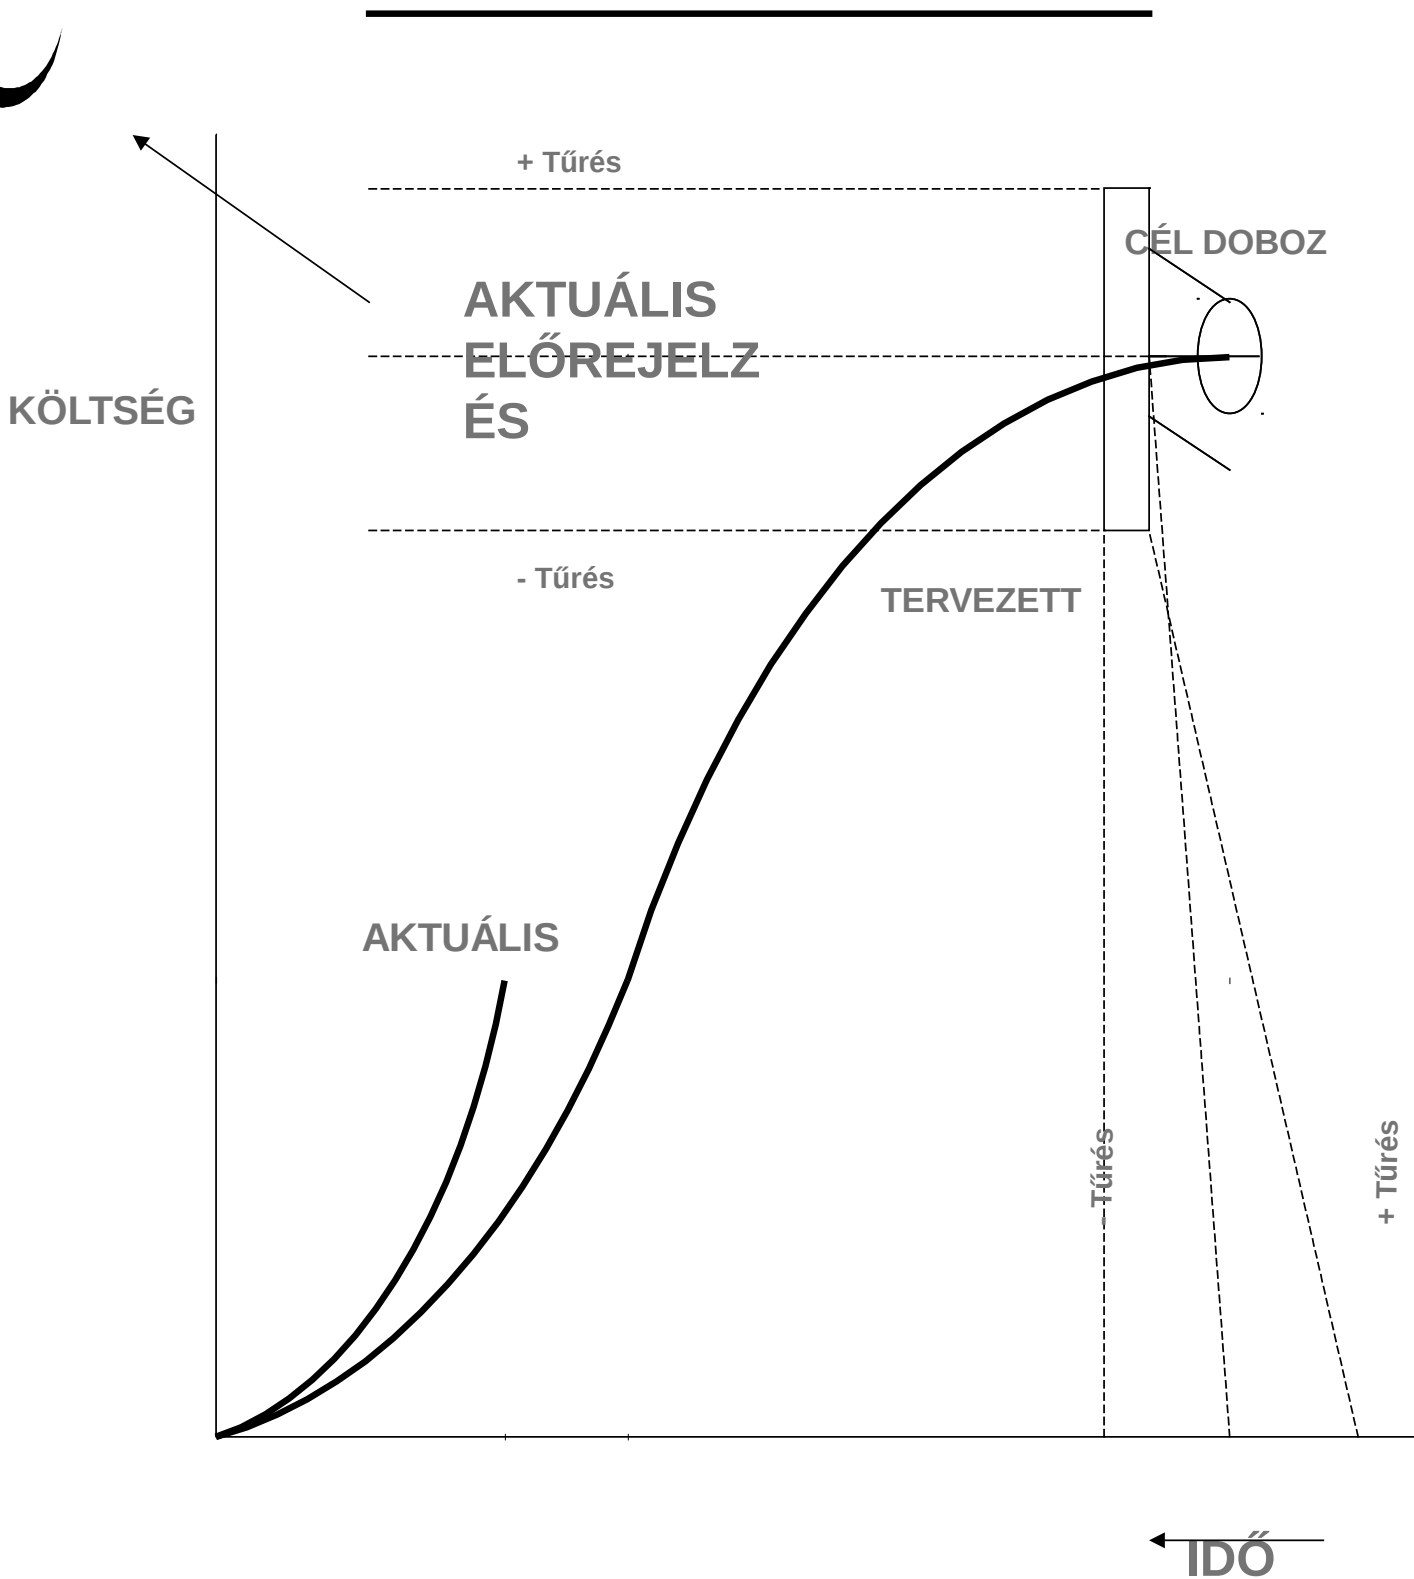


ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS

MUNKABESZÁMOLÓK




ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS

PROJEKT INDÍTÁS

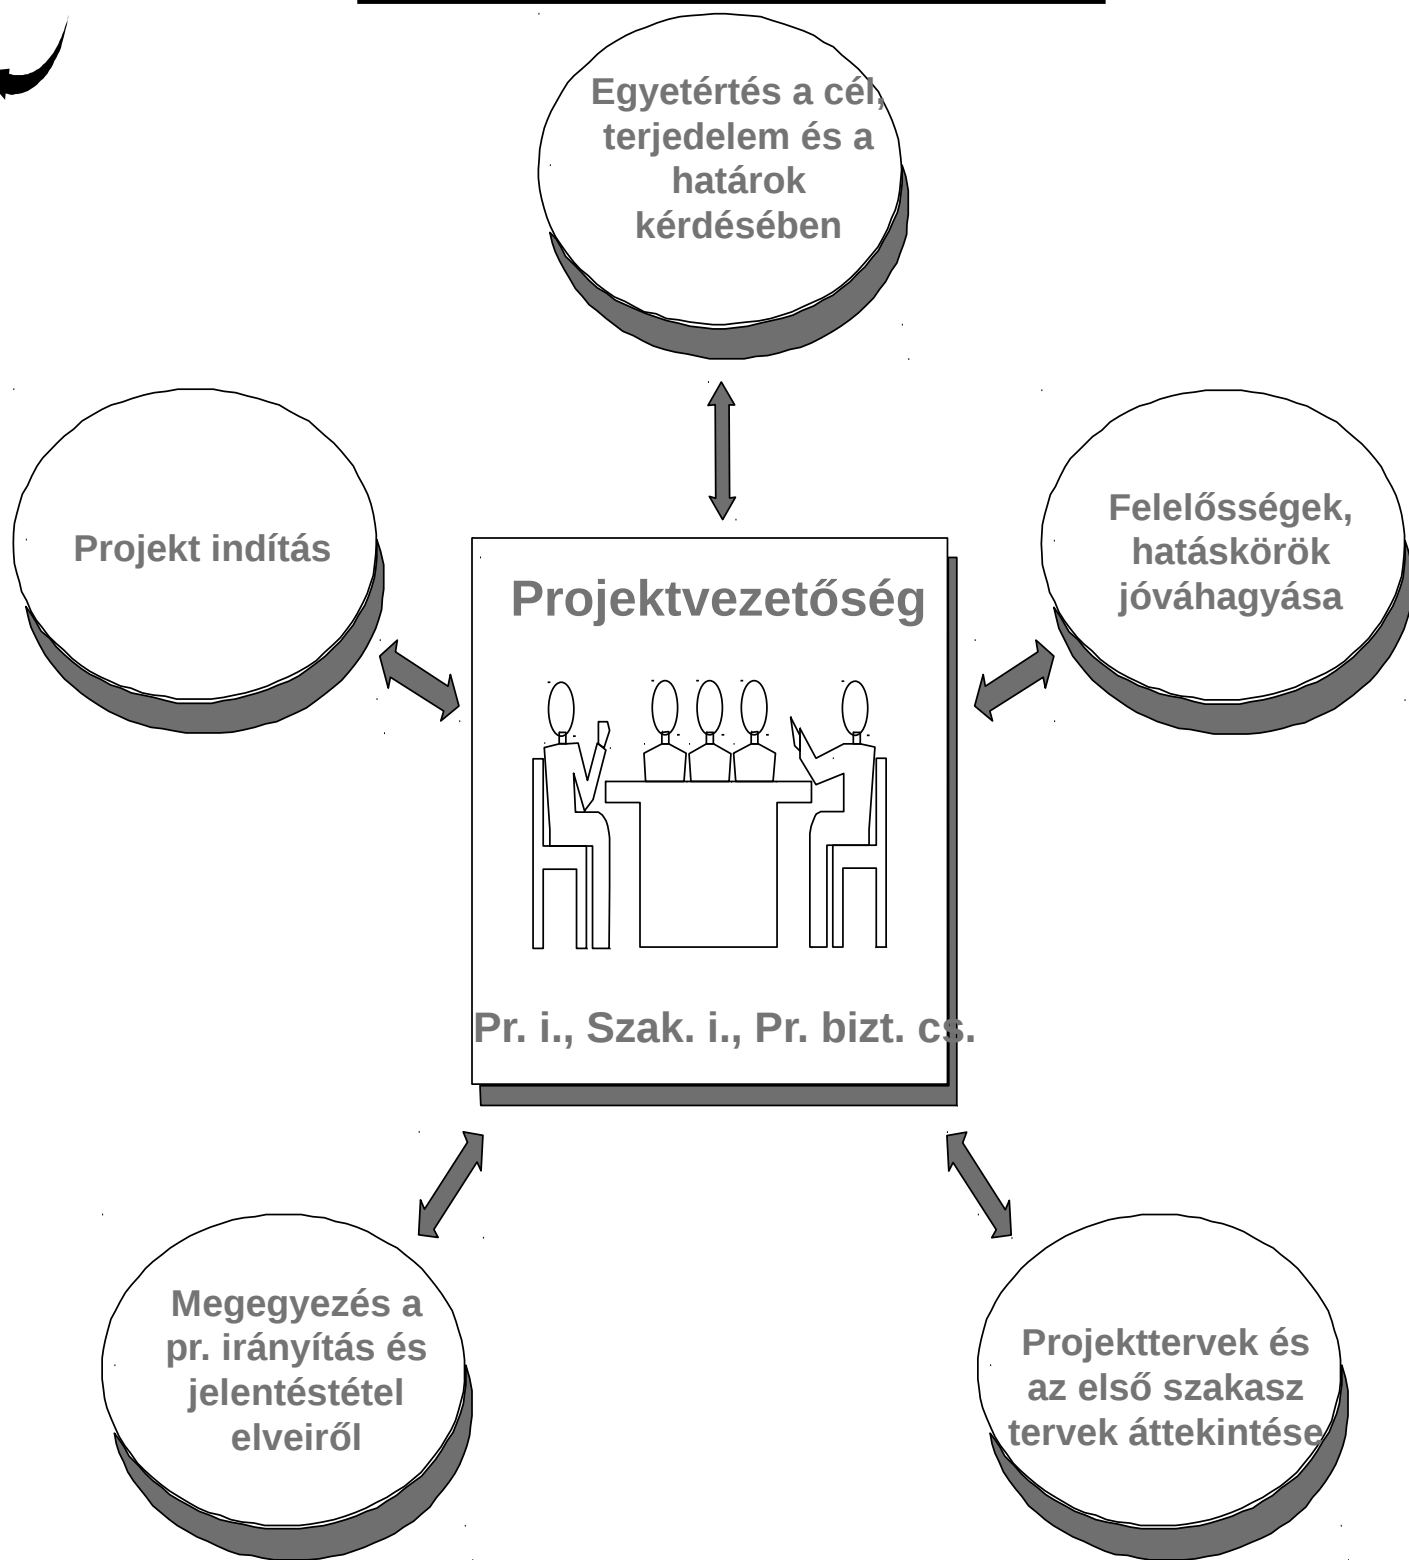


ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS

SZAKASZZÁRÓ ÉRTÉKELÉSEK

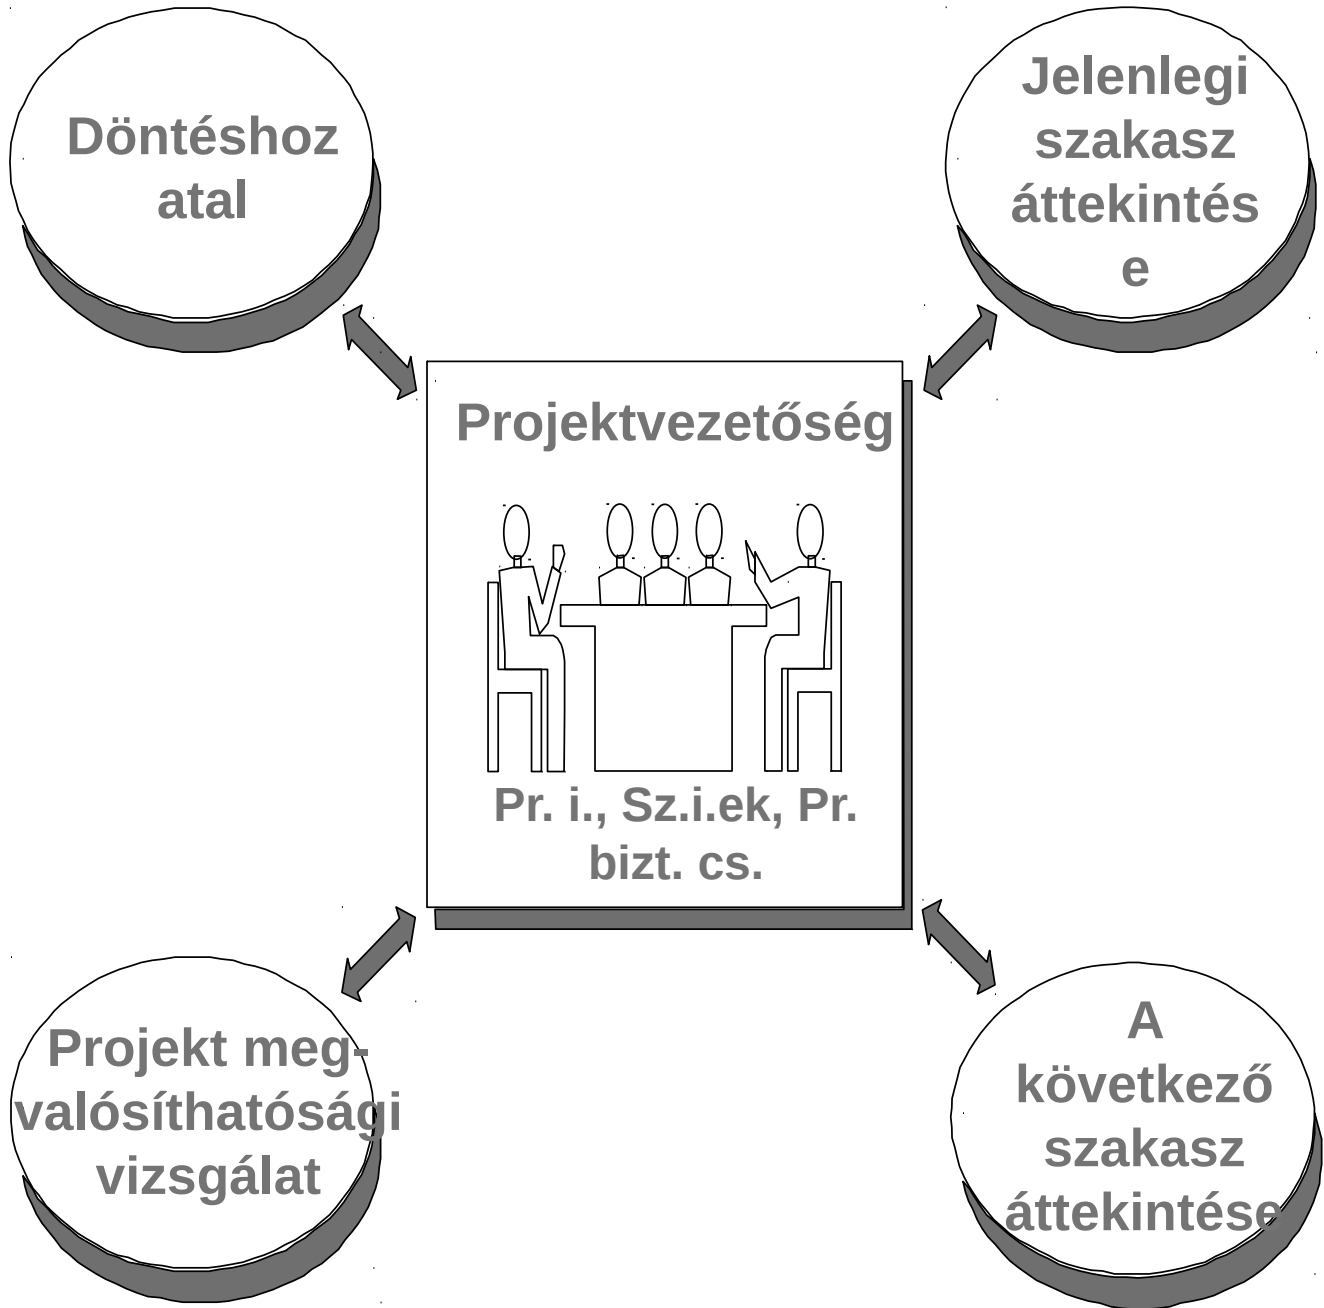


ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS

SZAKASZKÖZI ÉRTÉKELÉS

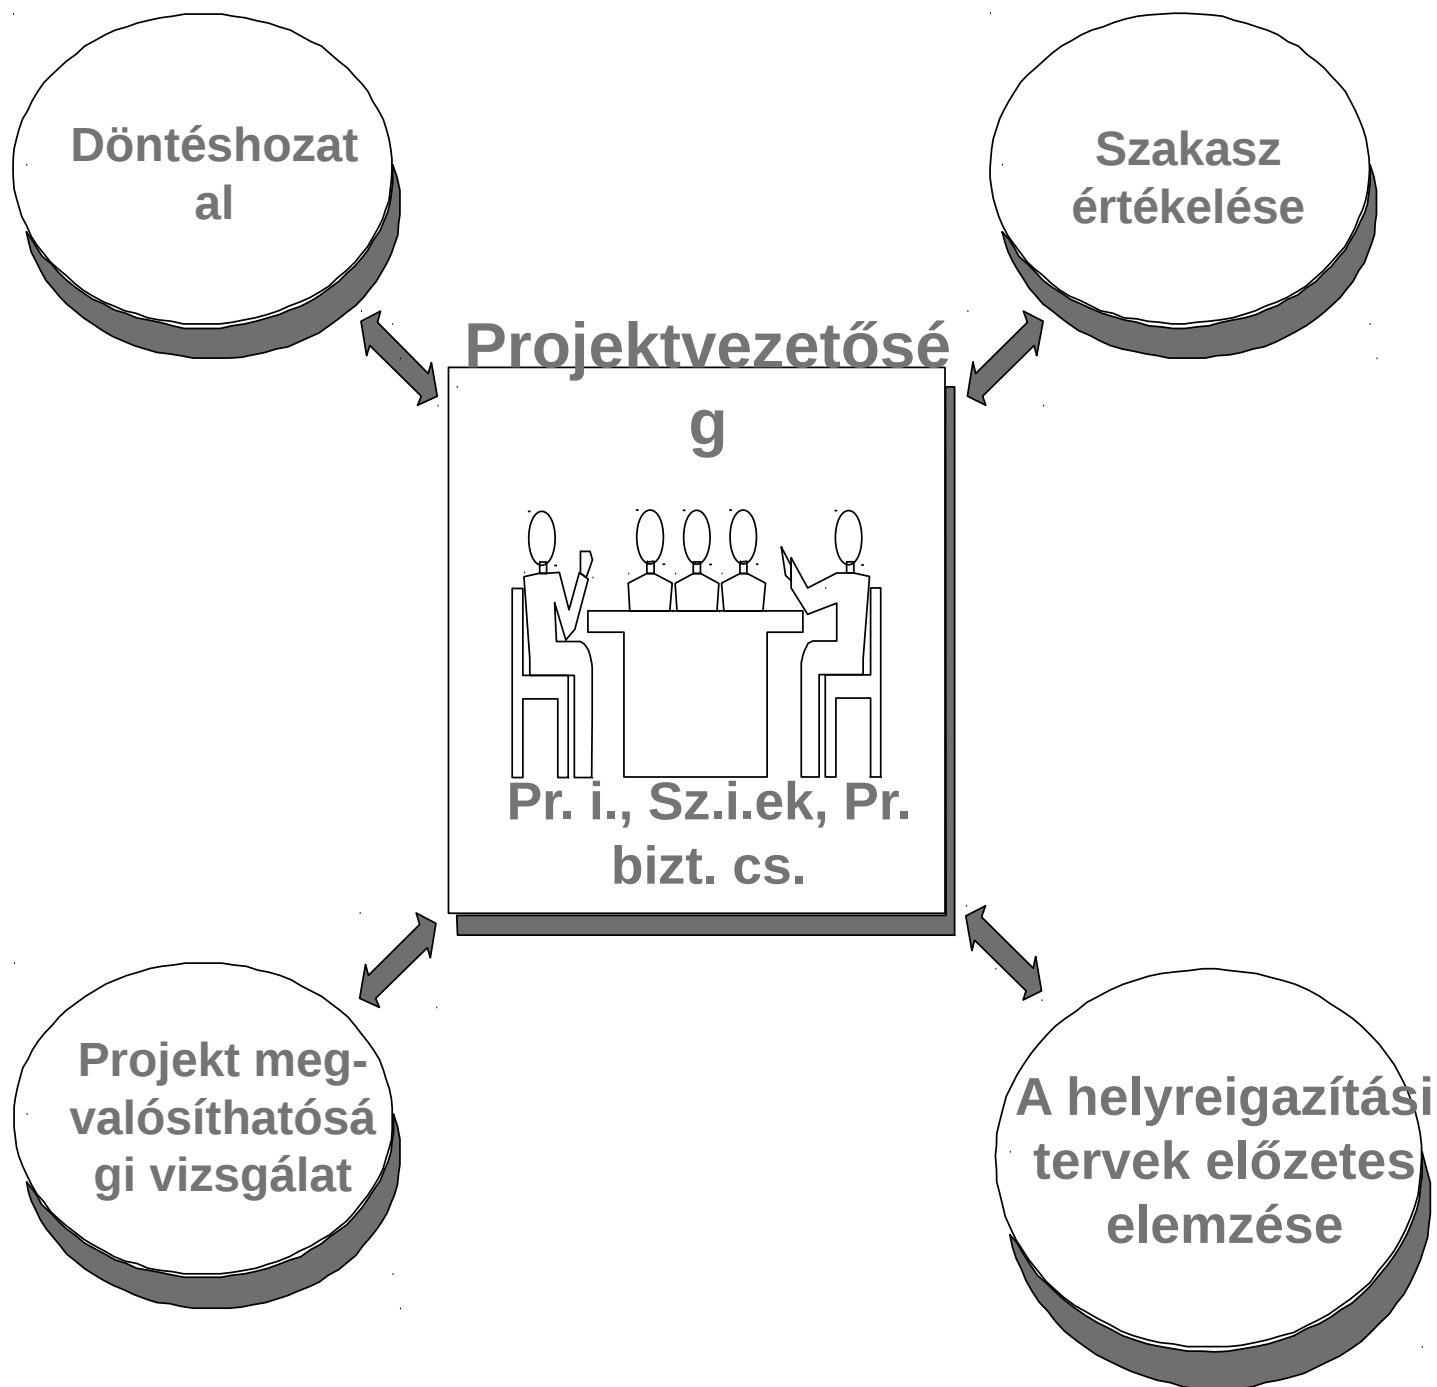

ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS

PROJEKT ZÁRÁS

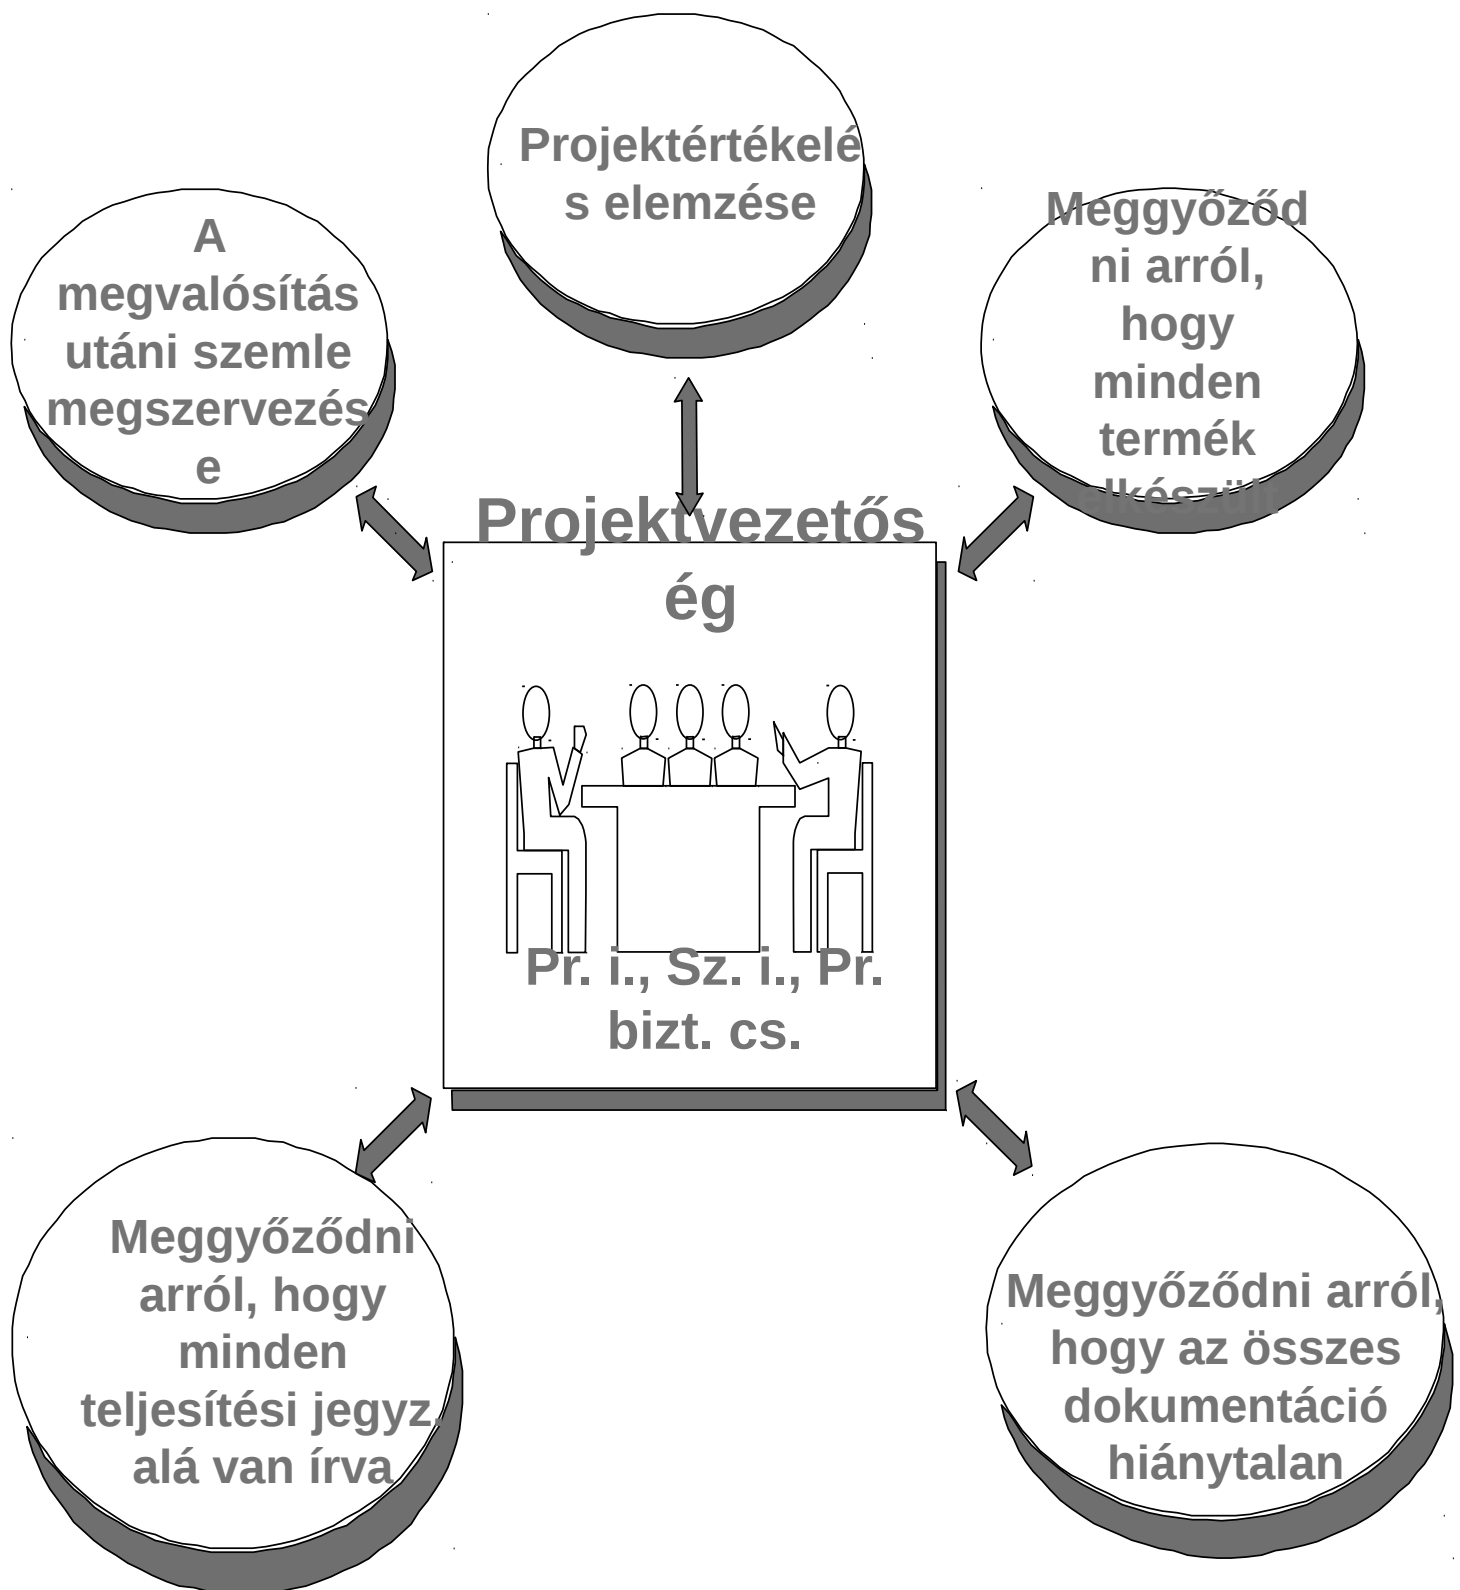

ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS



TELJESÍTÉSI (ÁTADÁS/ÁTVÉTELI) JEGYZŐKÖNYVEK

- ➔ JEGYZŐKÖNYV
 - ➔ RENDSZER
 - ➔ FELHASZNÁLÓ
 - ➔ ÜZEMELTETÉS
 - ➔ BIZTONSÁG
 - ➔ ADMINISZTRATÍV

➔ MIKOR

- ➔ Sikeres rendszerteszteléskor
- ➔ Felh. kritériumok kielég.
- ➔ Üzemeltetési kritériumok kielégítésekor
- ➔ A projekt végén
- ➔ A projekt végén

➔ ALÁÍRÓ

- ➔ Szakmai képvis.
- ➔ Felhaszn. képvis.
- ➔ Felhaszn. képvis.
- ➔ Ügyvezető (elnök)
- ➔ Ügyvezető (elnök)

ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS



AZ ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS SZINTJEI

STRATÉGIAI-SZINTŰ ELLENŐRZÉS

A PROJEKT MEGBÍZÓ A
PROJEKTVEZETŐSÉGET

PROJEKT-SZINTŰ ELLENŐRZÉS

A PROJEKTVEZETŐSÉG A
PROJEKT-/SZAKASZIRÁNYÍTÓT

SZAKASZ-SZINTŰ ELLENŐRZÉS

SZAKASZIRÁNYÍTÓ A
CSOPORTVEZETŐT

EGYÉN-SZINTŰ ELLENŐRZÉS

A CSOPORTVEZETŐ A MUNKACSOPORT
TAGJAIT



ELŐREHALADÁS ELLENŐRZ. ÖSSZEFOGLALÁSA

ELŐREHALADÁS ELLENPRZ. ÖSSZEFOGLALÁSA

- ➔ Ellenőrzés/számonkérés központba állítása
- ➔ Nem 'duma parti'-kból áll
- ➔ Döntés centrikus
- ➔ Logikus szervezeti és jelentéstételi szerkezet
- ➔ Gazdaságos
- ➔ Jelentések - az összejövetelek termékei
- ➔ Kevesebb adminisztrálás
